

Relatório de Desempenho do Projeto MecOn: Sprint 2

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
20/06/2026	1.0	Criação do Relatório de Desempenho (Sprint 2)	Andrey D. M. Alves

1. Resumo Executivo da Sprint 2

- **Período da Sprint:** 01/06/2026 a 05/06/2026
- **Objetivo da Sprint:** Disponibilizar o catálogo de oficinas com busca e filtros funcionando, além do módulo de perfil do usuário com gestão de veículos e histórico de manutenção vinculado a cada veículo.
- **Status Geral:** Dentro do prazo.

2. Indicadores de Produtividade (Métricas de Fluxo)

2.1. Métricas de Tempo (Médias da Sprint)

- **Response Time (Tempo de Resposta):** 1 dia. Tempo médio entre a identificação de um impedimento ou decisão pendente em uma Daily e sua resolução.
- **Cycle Time (Tempo de Ciclo):** 1,20 dia em média por tarefa. Tempo médio em que uma tarefa permaneceu em desenvolvimento ativo, do início da implementação até sua conclusão e validação.
- **Lead Time (Tempo de Entrega):** 5 dias úteis. Ciclo completo da sprint, do início do planejamento até a entrega final de todas as tarefas.

2.2. Métrica de Volume (Capacidade)

- **Throughput (Vazão):** 5 tarefas entregues na Sprint 2, dentro de um total de 20 tarefas entregues ao longo das quatro sprints do projeto.

3. Análise de Rastreabilidade e Cruzamento de Dados

Cruze as informações deste relatório com o **Documento de Acompanhamento** da Sprint.

3.1. Planejado vs. Realizado (Escopo)

- **Tarefas Planejadas no Backlog:** 5
- **Tarefas Concluídas (Throughput):** 5

- **Justificativa de Desvios:** Todas as tarefas planejadas foram entregues dentro do período. O único ponto de atenção registrado nas Dailys foi o aumento do Cycle Time da tarefa "Listagem e filtros de oficinas", causado por um erro de reuso de placeholders nomeados em consultas SQL com múltiplas cláusulas LIKE. O impedimento foi identificado e corrigido dentro da própria sprint, sem necessidade de reposicionar a tarefa para o backlog da Sprint 3.


3.2. Eficiência e Esforço

- **Total de Horas Trabalhadas (Equipe):** 15
- **Nº de Entregas Semanais Realizadas:** 5
- **Relação Horas/Throughput:** 3 horas por tarefa

4. Análise Crítica e Plano de Ação

4.1. Gargalos Identificados (Dificuldades Encontradas)

O Cycle Time elevado na tarefa de “Listagem e filtros de oficinas” devido a um erro de reuso do mesmo placeholder nomeado em múltiplas condições LIKE dentro da mesma consulta SQL. Esse problema fez com que a tarefa permanecesse em desenvolvimento ativo por 2 dias, o dobro da média das demais tarefas da sprint (1 dia cada), conforme ilustrado no gráfico abaixo.

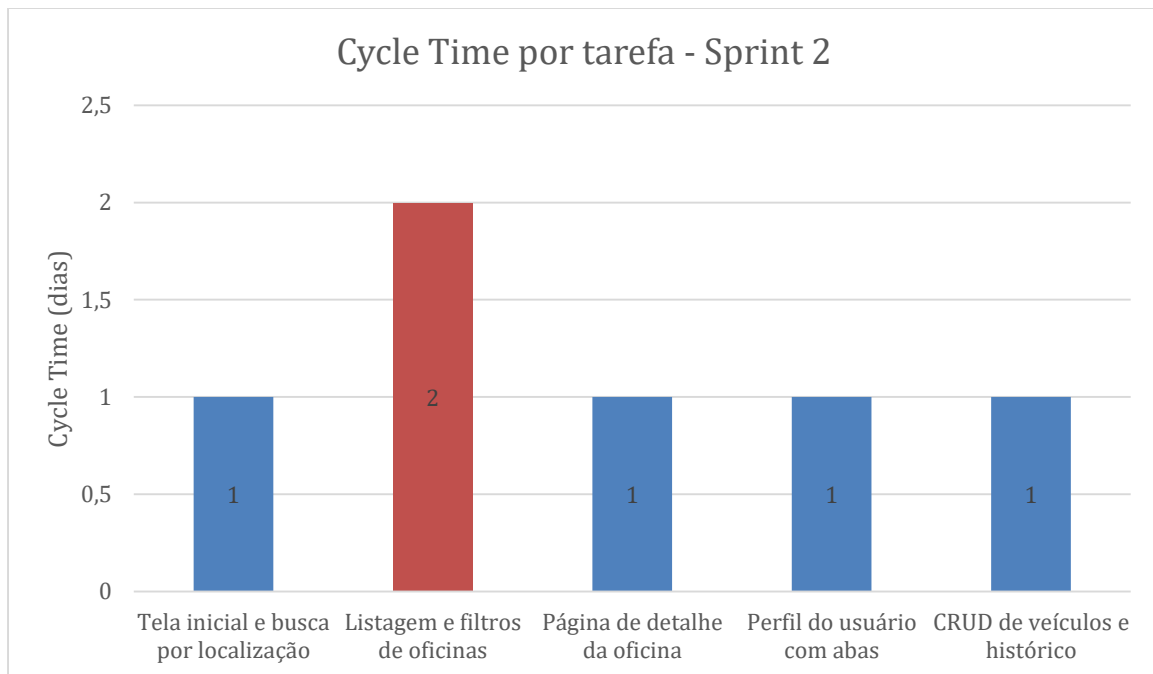

4.2. Estratégia de Mitigação

Ao identificar o gargalo, decidiu-se nomear cada placeholder de forma única dentro de uma mesma consulta SQL, mesmo quando o valor informado pelo usuário é o mesmo em diferentes condições (por exemplo, buscar o mesmo termo em nome, cidade e bairro simultaneamente). Essa decisão foi registrada como consenso técnico da Daily e aplicada retroativamente aos demais endpoints de busca e filtro construídos na mesma sprint, evitando que o mesmo padrão de erro se repetisse nas tarefas seguintes.

4.3. Lições Aprendidas na Gestão do Fluxo

Identificar o gargalo já na Daily seguinte ao início da tarefa (e não apenas na Review de encerramento da sprint) permitiu corrigir o problema dentro do próprio período da sprint, sem impacto no Lead Time total nem necessidade de reposicionar a tarefa para a sprint seguinte.
